



Plan Preliminar del Proyecto

Planeación de sistemas de software (Gpo 107)

Yolanda Martínez Treviño

Lic. Martha E. Galindo V. MSI

David Alonso Cantú Delgado

Cristian Ricardo Polo Garza

Alfonso Quintanilla

Ricardo Antonio Fernandez Wong

Emilio Antonio Peralta Montiel — A01712354

Ricardo Bastida Rodríguez — A00839429

Marco Antonio Torres Ramírez — A00839451

Andrés Huerta Robinson — A00838626

Diego Guadiana Manjarrez — A01285889

Campus Monterrey

Marzo, 2026



Objetivo.....	2
Entregables del proyecto	3
WBS.....	3
Calendario.....	4



Objetivo

Desarrollar e implementar un sistema web centralizado para la Asociación de Espina Bífida en un lapso de 15 semanas que automatice la gestión de beneficiarios, el control de inventario, el registro de citas y la generación de reportes operativos. El objetivo es reducir significativamente el tiempo administrativo de la organización y proporcionar una herramienta para el seguimiento preciso de cobros y pagos en parcialidades durante un plazo de ejecución de 15 semanas.

- Criterios de éxito (costo/esfuerzo): Reducir a 0 el uso de libretas y archivos de Excel aislados para la operación diaria.
- Criterio de éxito (rendimiento): Disminuir el tiempo de generación de reportes operativos de ~4 horas a alrededor de 3 segundos.
- Criterio de éxito (calidad): Asegurar el control exacto del inventario y del cálculo de saldos en equipos médicos entregados a parcialidades.

Entregables del proyecto

Entregable	Descripción	Responsable
Documento SRS	Documentación formal de alcance, restricciones y requerimientos (funcionales, no funcionales y de dominio).	Equipo de Análisis
Diseño UI/UX	Prototipo de alta fidelidad y flujos de pantalla del sistema web.	Equipo de Diseño
Sistema web funcional	Aplicativo desplegado en la nube con los módulos de operación, finanzas y reportes.	Equipo de desarrollo
Migración de datos	Base de datos histórica trasladada al nuevo entorno relacional.	Admin. De base de datos
Manual de usuario	Documentación técnica y guía de uso para el personal de la asociación.	Equipo de pruebas/sopORTE

WBS


Contexto y beneficios de la técnica

La Estructura de Desglose de Trabajo (WBS, por sus siglas en inglés) es una técnica fundamental para la planeación y el seguimiento del avance del proyecto. Su principal beneficio radica en la descomposición jerárquica del proyecto en componentes y entregables más pequeños y manejables. Esta división orientada a la entrega de valor facilita la estimación de esfuerzos, la asignación clara de responsabilidades y, sobre todo, permite un monitoreo preciso del progreso del equipo, asegurando que no se omita ninguna tarea crítica durante el ciclo de vida del desarrollo.



Aplicabilidad al proyecto de la Asociación

Para la construcción del Sistema de Gestión Administrativa de la Asociación de Espina Bífida, el WBS se convierte en nuestra hoja de ruta principal. Se ha estructurado lógicamente en cinco grandes fases (Administración, Análisis, Diseño, Desarrollo, y Pruebas/Despliegue) que reflejan nuestro proceso de ingeniería. Esta técnica nos permite dar un seguimiento ordenado a la construcción y entrega progresiva de los módulos de software (Beneficiarios, Citas, Servicios e Inventario). Así, garantizamos al socio formador que cada pieza desarrollada es evaluada e implementada sistemáticamente para resolver sus cuellos de botella operativos reales.

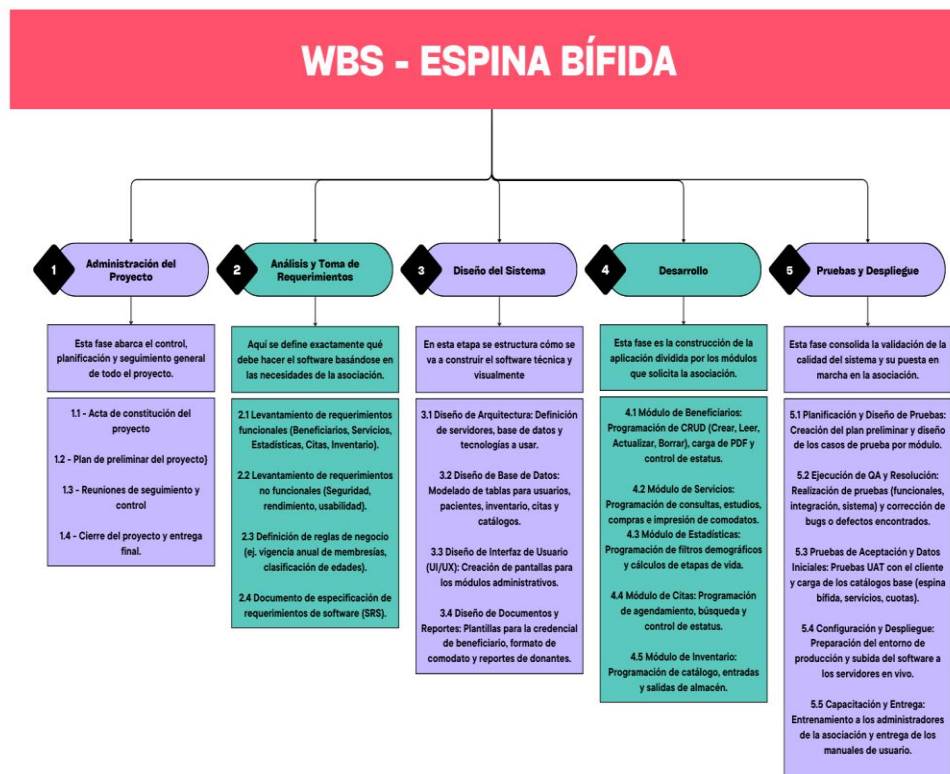

Calendario



La ejecución del proyecto se ha planificado utilizando un Diagrama de Gantt, abarcando un lapso total de 15 semanas para el desarrollo e implementación del sistema. Para asegurar una gestión ágil y entregas continuas, el cronograma se ha estructurado en cuatro bloques o Sprints principales (del Sprint 0 al Sprint 3). Esta distribución temporal refleja nuestra estrategia de trabajo:

- Las primeras semanas (Sprint 0) se dedican enteramente a las fases de Análisis y Diseño, consolidando los requerimientos y la arquitectura antes de escribir código.
- El Desarrollo se ejecuta de manera escalonada entre las semanas 6 y 15, liberando módulo por módulo (empezando por beneficiarios y servicios, hasta llegar a inventario y citas).
- Finalmente, se reserva un margen crítico en las últimas semanas (Sprint 3) para las Pruebas de aceptación, el Despliegue final y la Capacitación de los usuarios operativos de la asociación.

Project Timeline 2025 - Gantt Chart

