

ALCANCE DEL PLAN DEL PROYECTO: PROYECTO ESPINA BÍFIDA


PROYECTO NO.	FECHA DE ENVÍO
001	27/02/2026
OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Desarrollar e implementar un sistema web centralizado para la Asociación de Espina Bífida en un lapso de 15 semanas que automatice la gestión de beneficiarios, el control de inventario, el registro de citas y la generación de reportes operativos. El objetivo es reducir significativamente el tiempo administrativo de la organización y proporcionar una herramienta para el seguimiento preciso de cobros y pagos en parcialidades durante un plazo de ejecución de 15 semanas.	

Paso 1. Entregables del proyecto


ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
Plan Preliminar del Proyecto	Documento inicial que define los objetivos, el alcance general, el WBS y el cronograma estimado a 15 semanas.	Emilio Peralta
Backlog del Proyecto	Lista priorizada de Historias de Usuario divididas en 3 sprints principales (Core, Operación diaria, Reportes).	Andrés Robinson
Documento de Requisitos de Software	Documento SRS (IEEE 830) que detalla los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.	Diego Guadiana
Base de datos Implementada	Esquema de tablas creado e instanciado (usuarios, pacientes, inventario, catálogos) con datos iniciales cargados.	Ricardo Bastida
Plan de Pruebas documentado	Estrategia de QA, definiendo el alcance, casos de prueba funcionales y entorno necesario para validar el software.	Marco Torres
Reporte final de ejecución de pruebas	Documento que detalla los resultados del QA, la resolución de bugs y la validación final (UAT) antes del despliegue.	Emilio Peralta

Paso 2. Lista de tareas del proyecto

Para la construcción del Sistema de Gestión Administrativa de la Asociación de Espina Bífida, el WBS se convierte en nuestra hoja de ruta principal. Se ha estructurado lógicamente en cinco grandes fases (Administración, Análisis, Diseño, Desarrollo, y Pruebas/Despliegue) que reflejan nuestro proceso de ingeniería. Esta técnica nos permite dar un seguimiento ordenado a la construcción y entrega progresiva de los módulos de software (Beneficiarios, Citas, Servicios e Inventario). Así, garantizamos al socio formador que cada pieza desarrollada es evaluada e implementada sistemáticamente para resolver sus cuellos de botella operativos reales.

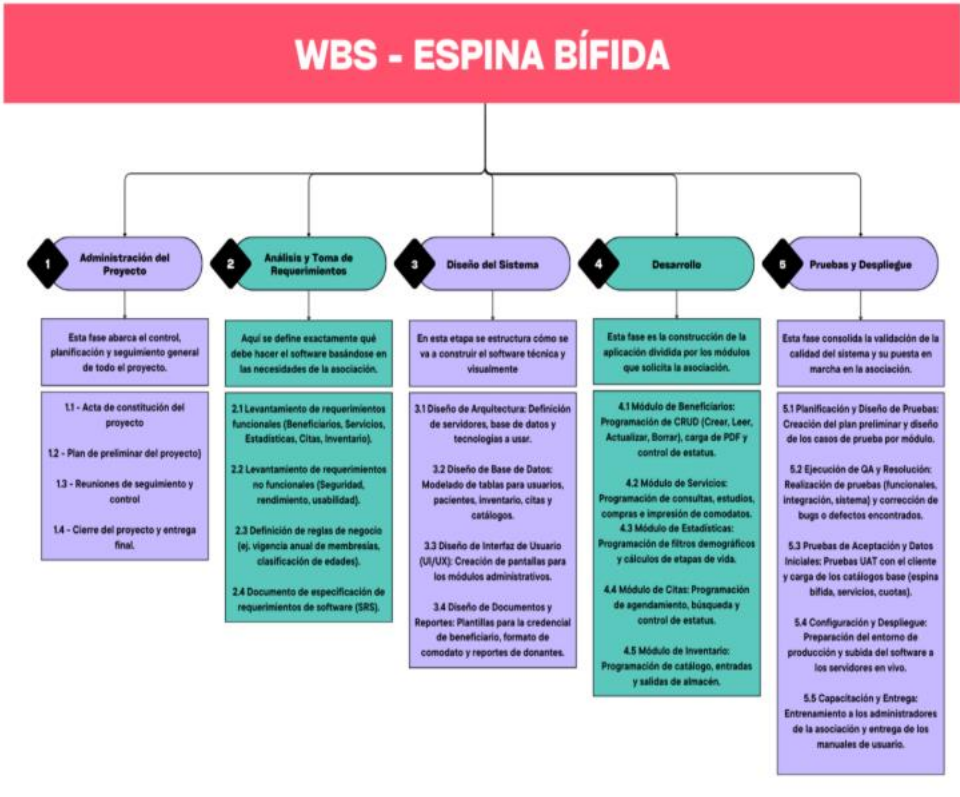

Project Timeline 2025 - Gantt Chart

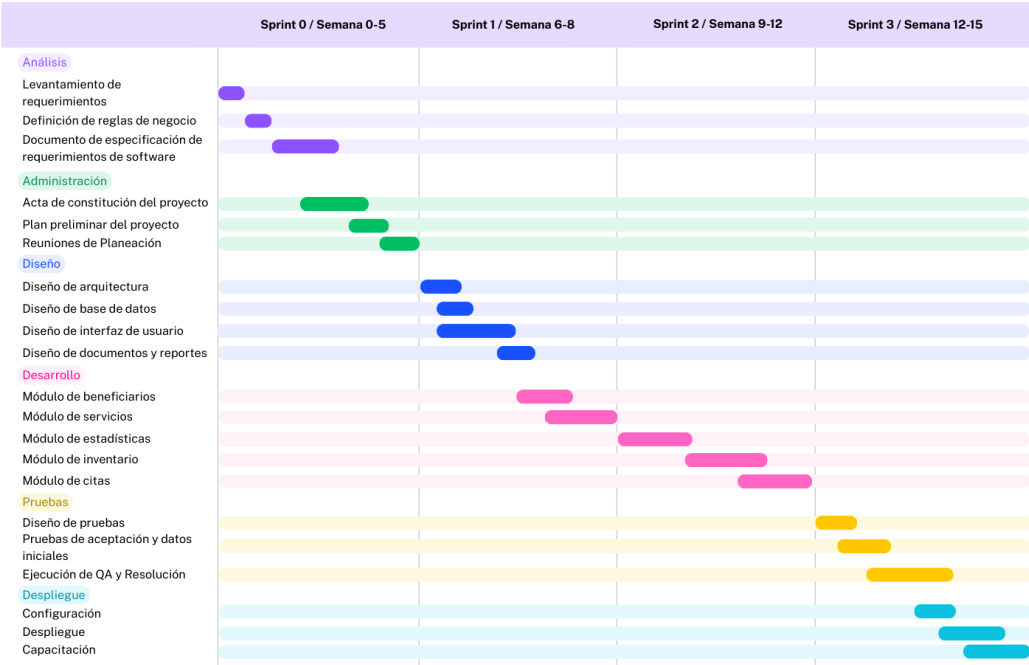

Paso 3. Fuera del alcance

Este proyecto NO logrará o incluirá lo siguiente:	Desarrollo de aplicación móvil. Integración con sistemas bancarios reales. Implementación de pagos en línea. Soporte técnico posterior a la entrega académica.
--	---

Paso 4. Supuestos del proyecto

NO.	PRESUNCIÓN
1	Los usuarios cuentan con acceso a internet. De caso contrario no les será posible hacer uso del sistema.
2	

Paso 5. Restricciones del proyecto

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	9/02/2026
FECHA DE LANZAMIENTO / PUESTA EN MARCHA	12/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	12/06/2026
RESTRICCIONES DE CALIDAD O RENDIMIENTO	- El sistema solo será probado con un volumen de datos equivalente a la operación actual de la asociación; no se garantiza rendimiento óptimo para miles de usuarios concurrentes. - El tiempo de respuesta esperado de las pantallas será menor a 3 segundos en condiciones normales de red, pero no se realizarán pruebas formales de estrés o carga.
LIMITACIONES DE EQUIPO / PERSONAL	- El desarrollo estará a cargo de un equipo reducido de estudiantes (2 personas), lo que limita el número de funcionalidades que pueden desarrollarse y probarse dentro de las 15 semanas. - No se contará con un tester dedicado de tiempo completo; las pruebas serán realizadas por los mismos desarrolladores y el socio formador cuando su agenda lo permita.
RESTRICCIONES REGULATORIAS	- El sistema almacenará datos personales sensibles (CURP, domicilio, información médica básica), por lo que todo acceso deberá estar protegido mediante usuario y contraseña, y solo será utilizado con fines académicos y de apoyo a la asociación. - No se implementará integración con sistemas fiscales ni bancarios, por lo que el sistema no sustituye procesos oficiales de facturación ni contabilidad de la asociación.

Paso 6. Estimaciones actualizadas

Estimar las horas requeridas para completar el proyecto.	2250 horas
--	------------

Paso 7. Aprobaciones

NOMBRE Y TÍTULO DE LAS PARTES INTERESADAS	ROL DE LAS PARTES INTERESADAS / APROBADORES	FECHA DE APROBACIÓN
